Fed. Road Dist. No.	State	F.A.P.	Fiscal Year	Sheet No.	Total Sheets
		133-B	1936	13	15
		133-C	1936	5	15

F.A.P. 133-C — Guide Posts

Stations	Lt.	Rt.
195+76	1	1

F.A.P. 133-C — Cable Guard Rail

Stations	Lt	Rt	Anch
182+00–184+03	203	203	2

F.A.P. 133C — Stone Curb (Item #64)

Sta.	Sta.	Lt.	Rt.
184+35	187+50	315	
184+50	185+00		50
187+20	190+00		280
190+00	192+70	270	
192+50	195+74		324
		585	654
Total			1239

F.A.P. 133C — 3'6" Grouted Cobble Gutter

Sta.	Sta.	Lt.	Rt.
187+50	190+00	250	

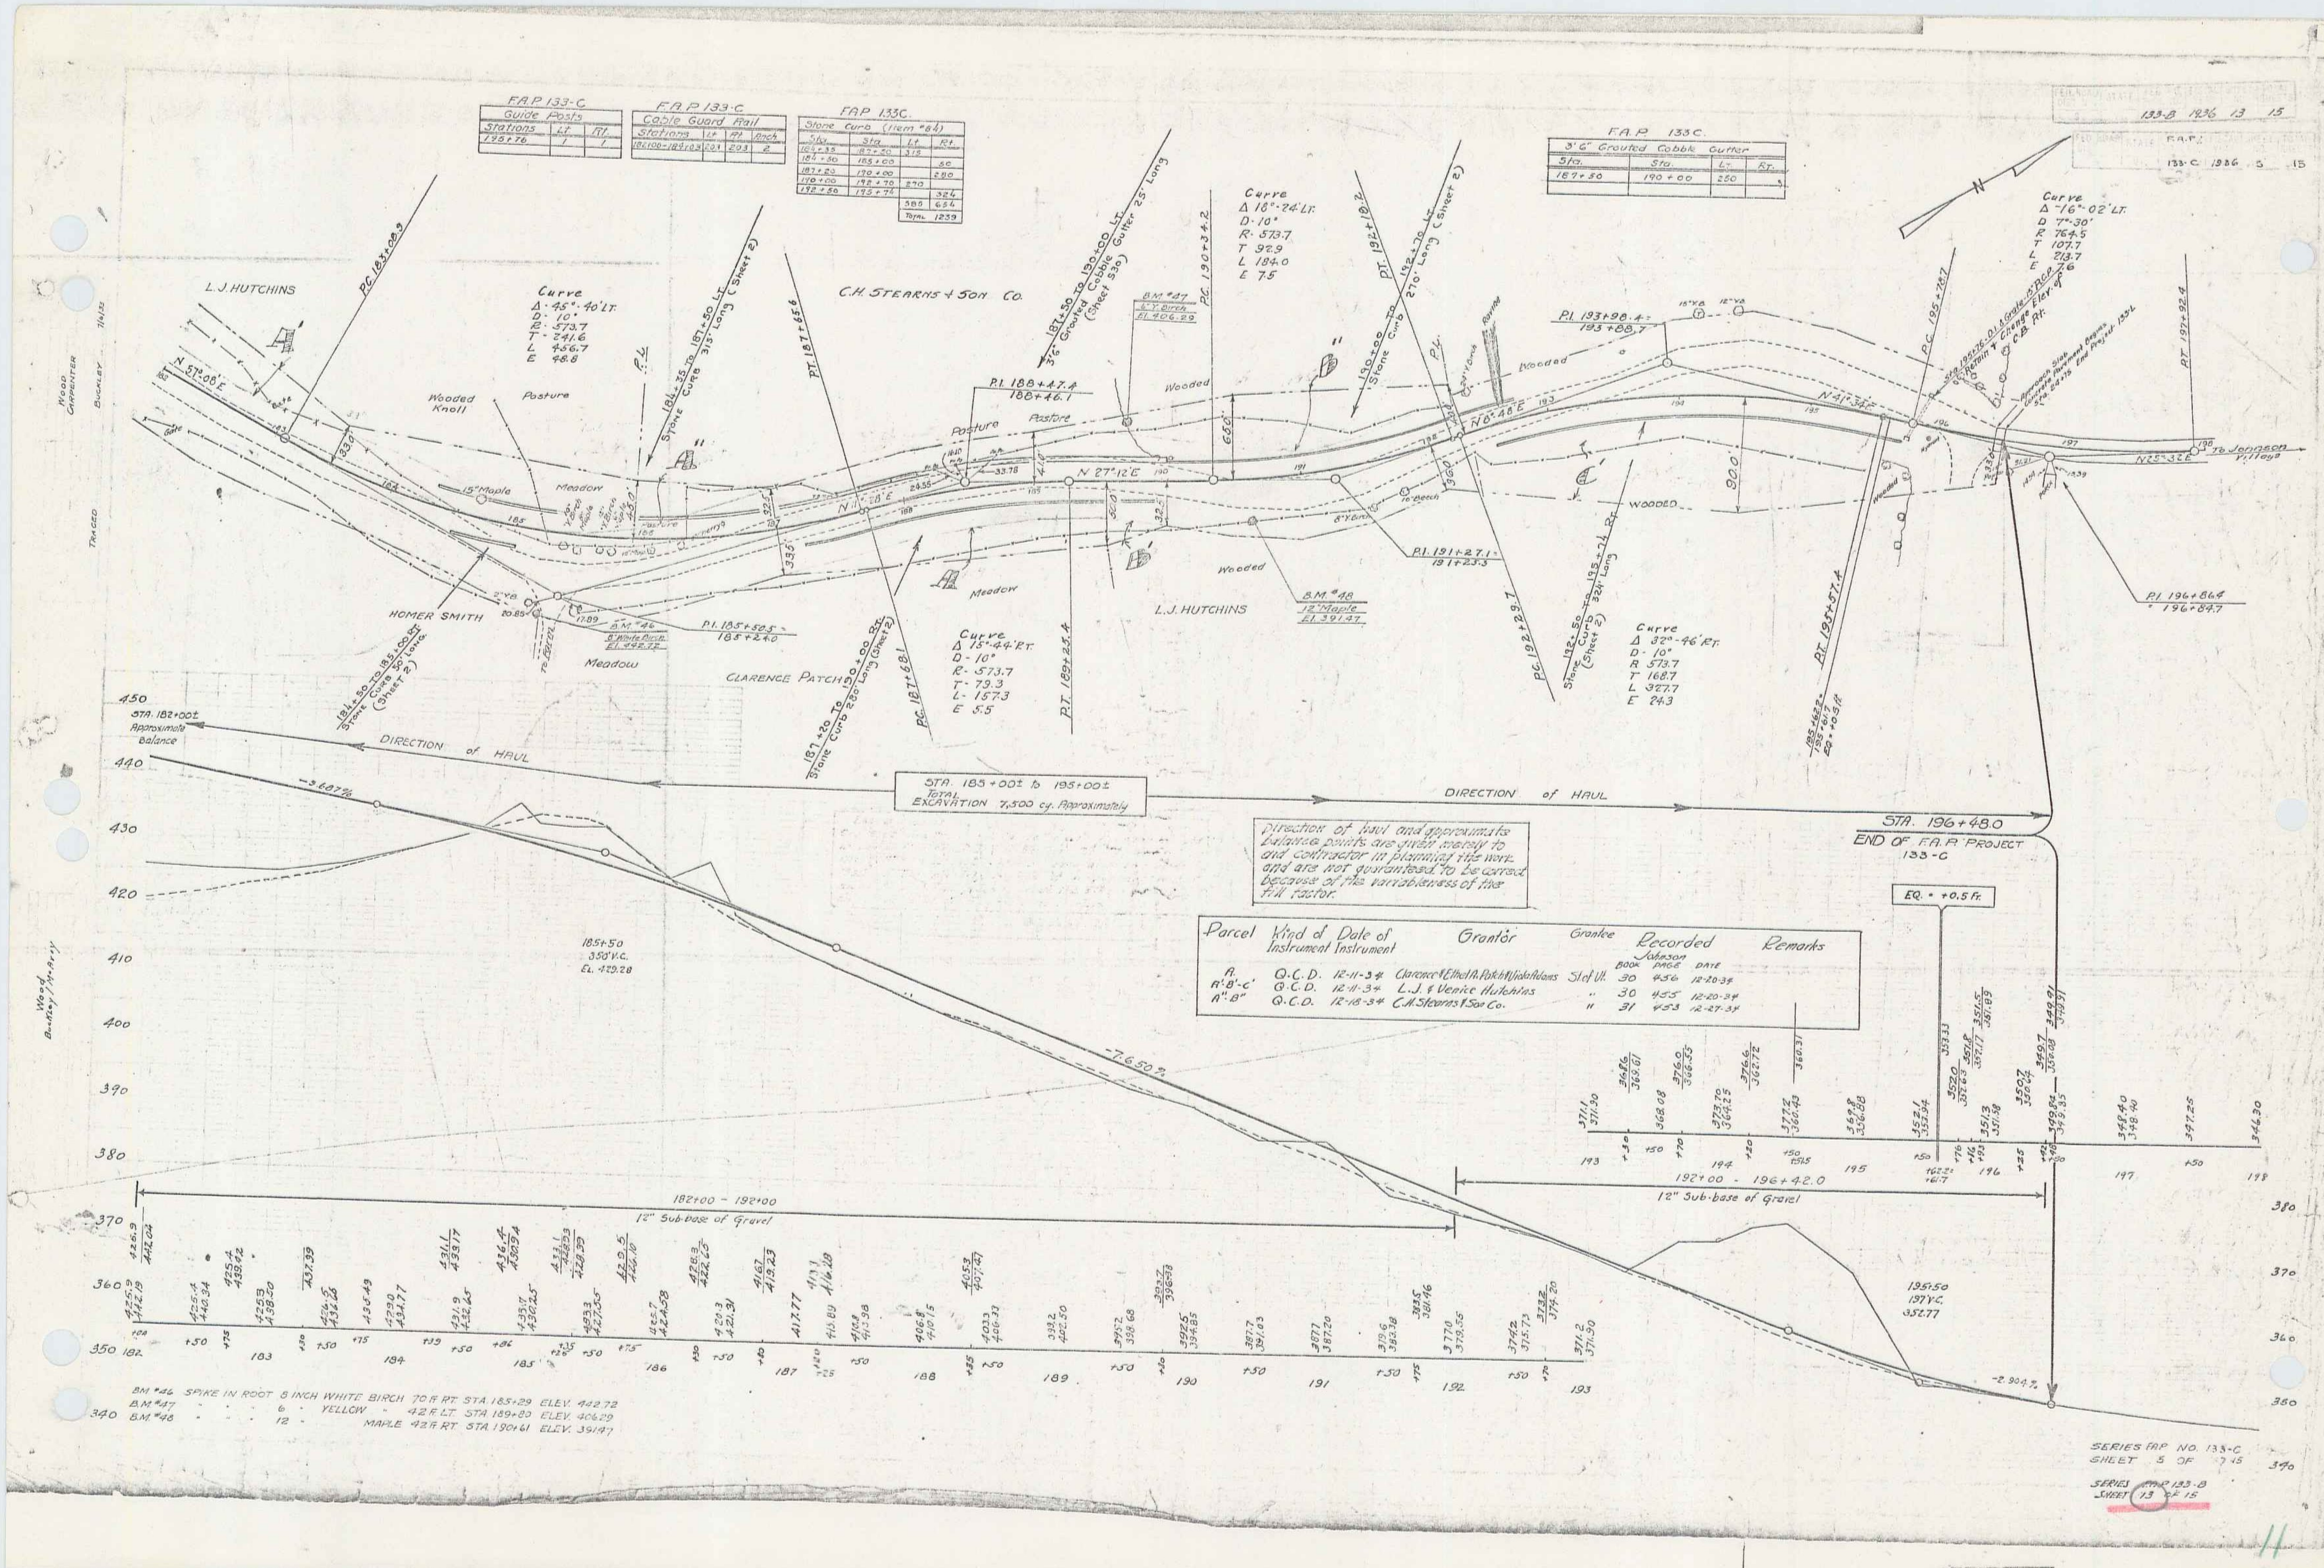

Direction of haul and approximate balance points are given merely to aid contractor in planning the work and are not guaranteed to be correct because of the variableness of the fill factor.

Parcel	Kind of Instrument	Date of Instrument	Grantor	Grantee	Recorded Johnson Book	Page	Date	Remarks
A.	Q.C.D.	12-11-34	Clarence & Ethel A. Patch & Viola Adams	St. of Vt.	30	456	12-20-34	
A'-B'-C'	Q.C.D.	12-11-34	L.J. & Venice Hutchins	"	30	455	12-20-34	
A"-B"	Q.C.D.	12-18-34	C.H. Stearns & Son Co.	"	31	453	12-27-34	

B.M. #46 SPIKE IN ROOT 8 INCH WHITE BIRCH 70 ft RT. STA. 185+29 ELEV. 442.72
B.M. #47 " " " 6 " YELLOW " 42 ft LT. STA. 189+80 ELEV. 406.29
B.M. #48 " " " 12 " MAPLE 42 ft RT. STA. 190+61 ELEV. 391.47

SERIES FAP NO. 133-C
SHEET 5 OF 15

SERIES F.A.P. 133-B
SHEET 13 OF 15

11
